


# ОТЧЁТ ПО СБОРУ И РАСХОДОВАНИЮ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ НА БУРЕНИЕ НОВОЙ СКВАЖИНЫ

<b>ВЫСТАВЛЕНО КВИТАНЦИЙ НА СУММУ:</b>	<b>2 735 040,00 Р</b>
В том числе:	
Полный взнос для пользователей системы общего поселкового водопровода:	2 687 300,00 Р = 7 700 Р x 349 (домовладений)
Уменьшенный (20%) взнос на обеспечение противопожарных мер для непользующихся общим поселковым водопроводом:	47 740,00 Р = 1 540 Р x 31 (домовладение)

<b>СОБРАНО СРЕДСТВ:</b>	<b>2 337 505,25 Р</b>	<b>79,79%</b>	(без учёта добровольных платежей)
по состоянию на 06.02.2024			
В том числе:			
Полный взнос для пользователей системы общего поселкового водопровода (частично или полностью):	2 145 431,52 Р	79,84%	
Уменьшенный (20%) взнос на обеспечение противопожарных мер для непользующихся общим поселковым водопроводом (частично или полностью):	36 960,00 Р	77,42%	
Добровольные дополнительные целевые платежи (около 65 человек):	155 113,73 Р		


<b>ТЕМПЫ СБОРА ВЗНОСОВ:</b>	по месяцам:	по году:
апр.23	0,00 Р	0,00 Р
май.23	1 534 852,89 Р	1 534 852,89 Р
июн.23	416 711,74 Р	1 951 564,63 Р
июл.23	65 742,16 Р	2 017 306,79 Р
авг.23	7 240,00 Р	2 024 546,79 Р
сеп.23	63 650,00 Р	2 088 196,79 Р
окт.23	38 527,27 Р	2 126 724,06 Р
ноя.23	30 120,00 Р	2 156 844,06 Р
дек.23	16 940,00 Р	2 173 784,06 Р
янв.24	3 080,00 Р	2 176 864,06 Р
фев.24	5 527,46 Р	2 182 391,52 Р

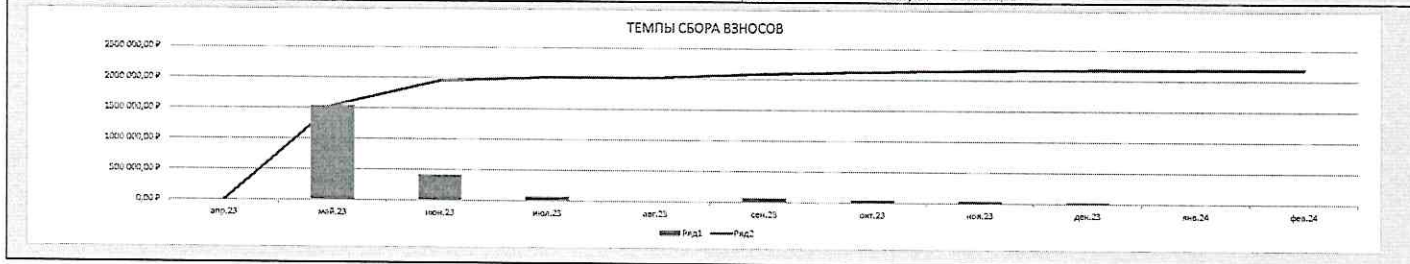

<b>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПО НЕОПЛАЧЕННЫМ ВЗНОСАМ:</b>	<b>552 648,48 Р</b>	<b>20,21%</b>
В том числе:		
Пустые участки без подключения (установлена плата за подключение):	163 170,00 Р	5,97%
Связались с Правлением, сообщили, что заплатят позже и/или частями:	84 700,00 Р	3,10%

<b>РАСХОДЫ ПО БУРЕНИЮ СКВАЖИНЫ И СОПУТСТВУЮЩИМ РАБОТАМ:</b>	<b>2 680 214,53 Р</b>
В том числе по видам работ:	

Дата платежа	Подрядчик/поставщик	Вид работ	Сумма	Комментарий
08.06.2023	ООО "ГИДРОСТРОЙ"	Работы по бурению скважины, установке мессона, насоса и запуску	594 290,50 Р	Аванс 25% от персональной цены - при заключении договора до начала работ
16.06.2023	ООО "ГИДРОСТРОЙ"	Работы по бурению скважины, установке мессона, насоса и запуску	594 290,50 Р	Аванс 25% от персональной цены - при заключении договора после начала работ
25.08.2023	ИП Убайдуллоев Сиродж Имомназарович	Работы по резке труб для фильтровой колонны (помощь главному подрядчику)	6 000,00 Р	
08.09.2023	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	Кабель управляющий МКЭШ 2*0,75 30м для датчика давления	3 909,00 Р	
14.09.2023	ООО "ЛПГ"	Частотный преобразователь ВЕСПЕР Е4-8400-030Н 22кВт 380В	85 280,00 Р	
15.09.2023	ИП Кошкин Сергей Владимирович	Исследование скважины (дважды)	23 000,00 Р	Приветка скважины
19.09.2023	ООО "ГИДРОСТРОЙ"	Работы по бурению скважины, установке мессона, насоса и запуску	943 924,53 Р	Окончательная доплата 44,26% от новой цены - после окончания работ и приёмки. Сумма договора уменьшена на 244 656,47 руб., в связи с просрочкой сроков выполнения работ по договору, изменением фактического состава работ и применяемых материалов, компенсацией затрат на техническую воду для бурения.
22.09.2023	Василина Алексей Александрович	Работы по выравниванию площадки и засыпке песком в связи с началом дождей	32 400,00 Р	
22.09.2023	Василина Алексей Александрович	Организация доставки технической воды для бурения	67 050,00 Р	50% стоимости компенсировано буровой компанией в виде уменьшения цены договора
27.09.2023	Василина Алексей Александрович	Организация доставки технической воды для бурения	15 700,00 Р	50% стоимости компенсировано буровой компанией в виде уменьшения цены договора
11.10.2023	ИП Мемин Сергей Владимирович	Работы по обвалке скважины и установке оборудования	72 980,00 Р	
18.10.2023	Рыбинин Антон Львович	Работы по изготовлению бетонного колодца	20 000,00 Р	Частичная оплата
23.10.2023	Рыбинин Антон Львович	Работы по изготовлению бетонного колодца	45 000,00 Р	Частичная оплата
24.10.2023	Рыбинин Антон Львович	Работы по изготовлению бетонного колодца	50 000,00 Р	Частичная оплата
26.10.2023	ИП Убайдуллоев Сиродж Имомназарович	Земельные работы	20 000,00 Р	Котлован и траншея для прокладки водопровода и кабеля на ВЗУ
30.10.2023	Рыбинин Антон Львович	Работы по изготовлению бетонного колодца	78 000,00 Р	Окончательная оплата
09.11.2023	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	Таблички "Пожарный гидрант"	12 860,00 Р	
23.11.2023	ООО "ДЕЛАЙ МЕБЕЛЬ"	Оформление (кромштейн) для табличек "Пожарный гидрант"	2 530,00 Р	
30.11.2023	Рыбинин Антон Львович	Работы по установке табличек "Пожарный гидрант"	9 700,00 Р	Установлено частично. Завершение работ весной после таяния снега.
11.12.2023	Рыбинин Антон Львович	Работы по установке розетки, прокладке кабеля, монтажу дренажного насоса в колодце	3 300,00 Р	

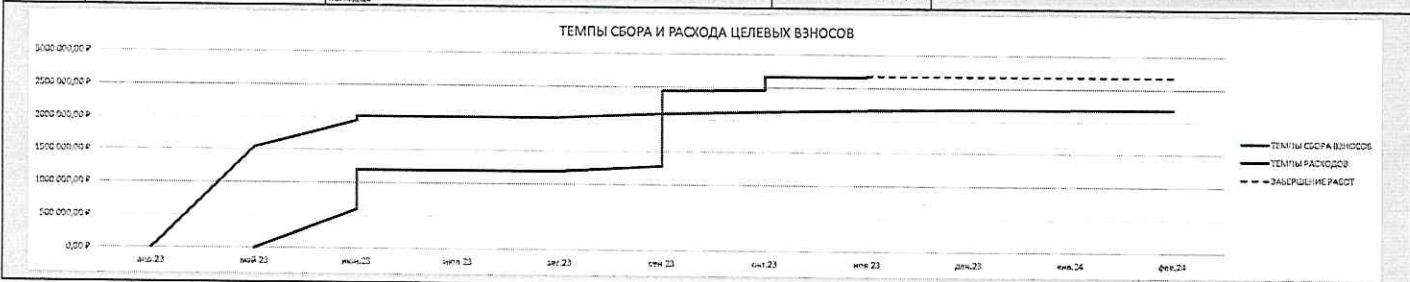

<b>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ:</b>	<b>0,00 Р</b>	<b>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОТСУТСТВУЕТ!</b>
---	---------------	-----------------------------------

<b>ОСТАТОК НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ СРЕДСТВ / НЕХВАТКА СРЕДСТВ:</b>	<b>-342 709,28 Р</b>	<b>Нехватка средств меньше несобранных взносов и временно покрыта из оборотных средств</b>
---	----------------------	--

ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОДЪЕМНИКАМ ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОСЕЛКЕ И ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ОБЩИМ ПОСЕЛКОВЫМ ВОДОПРОВОДОМ ДО НАЧАЛА АКТИВНОГО ЛЕТНЕГО СЕЗОНА ПРИ БЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ БУДУТ ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ НАПОРА ВОДЫ ДО УРОВНЯ, КОТОРЫЙ БЫЛ ДО ЗАПУСКА НОВОЙ СКВАЖИНЫ

Председатель Ассоциации собственников помещений в многоквартирном доме коттеджного поселка Иван Купала  
Иванов И.И. / Чумаков И.И. /
